




REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TEKAX (2DA ETAPA)

TIPO DE OBRA:	RECONSTRUCCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CONVENIOS CON MUNICIPIOS (TEKAX) Y RECURSO PROPIO
NUM. DE CONTRATO:	NO APLICA
EMPRESA CONSTRUCTORA:	NO APLICA
MONTO AUTORIZADO:	\$ 3,300,000.00
BENEFICIARIOS:	48,211
MODALIDAD:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AVANCE FÍSICO:	45.00%
AVANCE FINANCIERO:	99.29%
FECHA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO:	25 DE DICIEMBRE DE 2022

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- ESCARIFICADO
- SUBBASE
- RIEGO DE IMPREGNACIÓN
- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3 CM DE ESPESOR
- RIEGO TAPÓN
- SEÑALAMIENTO

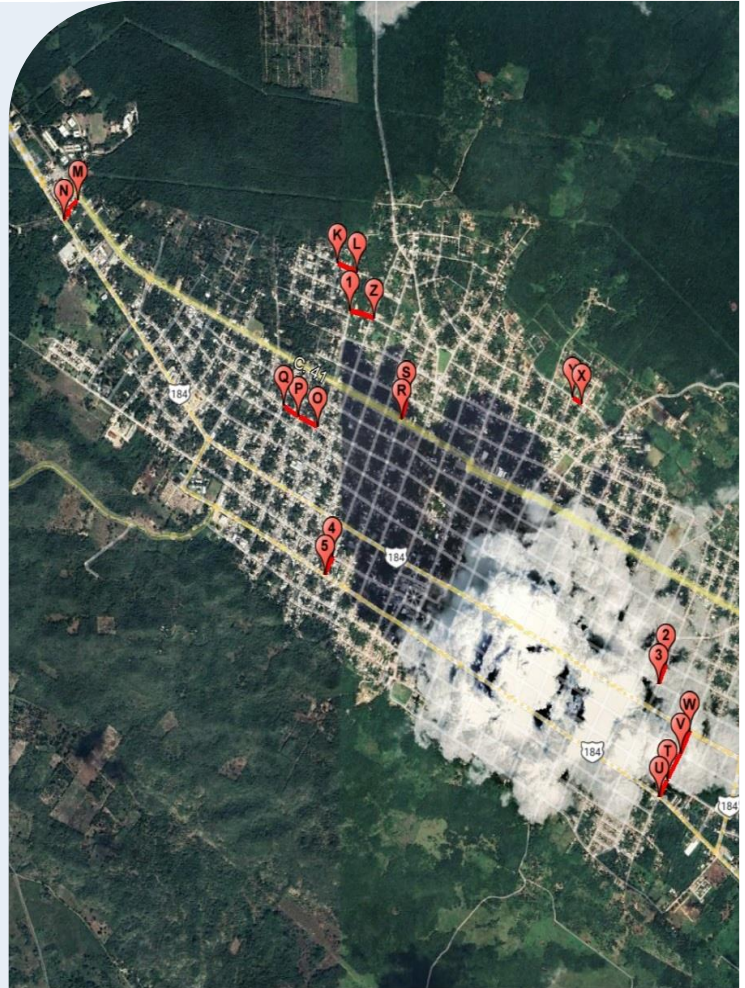

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN CALLES EN UN ÁREA DE 8,157.00 M2; EN BENEFICIO DE 48,211 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TEKAX.

LOS USUARIOS CONTARÁN CON UNA SUPERFICIE DE MAYOR UNIFORMIDAD Y ESTABILIDAD, DONDE PODRÁN REALIZAR UN RECORRIDO DE MANERA SEGURA; ESTO GENERARÁ QUE LOS USUARIOS, PUEDAN TRANSITAR EN SUS RESPECTIVOS VEHÍCULOS A MAYORES VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN, EN UN MENOR PERIODO DE TIEMPO. LO ANTERIOR REPRESENTA MENORES COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR Y DE TIEMPO DE TRASLADO, GENERANDO DE ESTA MANERA AHORROS EN COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE (CGV)

META

SUPERFICIE (M2)

8,157.00

